



Новации электронного активирования: формирование и подписание Акта о приемке выполненных работ с накопительным итогом по контрактам на выполнение работ в строительной сфере с укрупненной сметой контракта

Парамонова Наталья Николаевна

Заместитель начальника отдела аналитики
в сфере закупок



Доработки функционала ЕИС в сфере закупок в версии 12.2:

- ❑ Обеспечена возможность формирования и подписания Актов о приемке выполненных работ (с учетом накопительного итога приемки работ) по контрактам со специализацией «Строительство» и укрупненной сметой контракта (приказ Минстроя России № 841/пр)

Для этого реализованы следующие возможности:

- Создание структурированной укрупненной сметы контракта в Личном кабинете поставщика
- Отображение информации об объеме и стоимости фактически принятых работ с начала выполнения работ (накопительный итог), а также в отдельных графах - объема и стоимости фактически выполненных в отчетном периоде работ
- Корректировка ранее заактивированного объема выполненных работ в отчетном периоде без отдельного выставления корректировочного документа о приемке

ОСОБЕННОСТИ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

❑ Форма Акта о приемке выполненных работ с накопительным итогом - письма Минстроя России от 30.12.2021 № 58204-см/09, № 58202-см/09

❑ Акт с накопительным итогом:

- весь перечень позиций по смете контракта
- объем (количество) и стоимость выполненных работ, поставленного оборудования с начала выполнения работ
- объем (количество) и стоимость выполненных работ, поставленного оборудования за отчетный период
- отражение возвратных позиций, не учитываемых в итоговой стоимости акта
- возможность корректировки ранее заактивированных позиций в отчетном периоде
- отражение поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной заказчиком поставщику и удерживаемой из оплаты по акту
- возможность указания отрицательного значения итоговой суммы отчетного периода, если такой акт завершает исполнение по контракту

❑ Доступно по контрактам со специализацией «Строительство»

❑ Для возможности формирования акта с накопительным итогом подрядчику необходимо сформировать/загрузить структурированную смету контракта в Личном кабинете поставщика. Предусмотрено изменение сметы контракта при заключении дополнительного соглашения и учет внесенных изменений при очередном активировании

❑ Формирование Акта также возможно по текущим контрактам, заключенным по конкурентным процедурам после 01.01.2022, в т.ч. при наличии подписанных в ГИС ЕИС актов о приемке выполненных работ без накопительного итога

❑ В сведениях о контракте объект закупки с типом «Работа» указывается 1 строкой, принимаемое на учет оборудование (с типом «Товар») должно быть выделено отдельной строкой

Акт о приемке выполненных работ № 002-Ф от 27.06.2022

Заказчик: Тестовая организация 0009 ИНН/КПП: 4664448322/444448322 Адрес: 119270, Г Москва, ПР МУРМАНСКИЙ, 14, Расчетный счет 27849735600000032423 в ПАО Сбербанк БИК 446365867 корреспондентский счет 65735456860000216145

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Саянлес"ИНН/КПП: 5932456101/435345346 Адрес:655261,р-н Орджоникидзеvский,с. Сарала,ул. Набережная,двд11,

Контракт № 57-22-Д от 25.06.2022 г. (реестровый номер 146644483222000457, ИКЗ)

Наименование объекта Выполнение работ по строительству

Место выполнения работ: м-н Восточный, д.1

Отчетный период с 26.06.2022 г. по 27.06.2022 г.

В соответствии с условиями контракта № 57-22-Д от 25.06.2022 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование:

Номер по порядку	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Цена по контракту (контрактная цена), руб.	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период		Страна происхождения товара (оборудования)
						Количество (объем работ)	Стоимость, руб.	Количество (объем работ)	Стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.60.11.121 Оборудование медицинское (настенная медицинская консоль)	Штука	10	114769	1147690.00 (1262459.00)	1	114769.00 (126245.90)	0.00	0.00	ГЕРМАНИЯ
2	Строительные работы (41.20.40.900)				x	x	x	x	1740618.00	
2.1	Демонтажные работы покрытий, ограждений	Квадратный метр(055)	-40	968.38	2092184.99	2120.5	-38735.20	-40.00	-38735.20	
2.2	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Условная единица(876)	(здание 1 этаж)	1120329.98	1120329.98	-	550164.99	x	-10000.00	
2.3	Балки стропильные и подстропильные железобетонные (23.61.12.122)	Штука(796)	40	9953.83	1333813.22	40	398153.20	40.00	398153.20	РОССИЯ (643)
2.4	Пески строительные (08.12.11.130)	Кубический метр(113)	0	113.20	203760.00	1800	0.00	0.00	0.00	РОССИЯ (643)
2.5	Устройство перекрытий	Квадратный метр общей площади(081)	200	6956.00	38953600.00	200	1391200.00	200.00	1391200.00	
2.6	Строительство корпуса	Условная единица(876)		27420635.28	27420635.28	-	0.00	x	0.00	
	Всего по акту без НДС	x	x	x	x	x	2415551.99	x	1740618.00	x
	в т.ч. сумма, не облагаемая НДС	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x
	Сумма НДС (ставка 20%)	x	x	x	x	x	460156.60	x	348123.60	x
	Всего по акту общая стоимость	x	x	x	x	x	2887185.49	x	2088741.60	x
	Сумма удержаний	x	x	x	x	x	x	x	11123.00	x
	Всего к оплате	x	x	x	x	x	2887185.49	x	2077618.60	x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи 27.06.2022

Руководитель (должность) Фунтусов П. И. (подпись)

Заказчик

1 - Работы приняты в полном объеме

Всего к оплате с учетом удержаний заказчика

Всего к оплате по документам подрядчика	Сумма удержаний	Итого к оплате
2077618.60	13700.50	2063918.10

Пользователь (должность) Абросимова З. И. (подпись)


Документ подписан электронной подписью

ФОРМИРОВАНИЕ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Личный кабинет поставщика

Способы создания сметы контракта:

- формирование структурированной сметы контракта вручную через пункт контактного меню контракта «Создать смету контракта»
- сервис загрузки укрупненной сметы по интеграции со сметными программами по форматам ГИС ЕИС

 ближайшая перспектива – ручная загрузка сметы в ЛК поставщика по шаблону ГИС ЕИС

Переход к созданной смете контракта по гиперссылке в столбце «Смета контракта»

Переход к изменению или удалению сметы контракта через контекстное меню

Функция удаления сметы доступна только, если нет сформированных и подписанных актов

После сохранения сметы для всех подписанных актов **недоступна** возможность создания корректировочных документов или создание новых на основании уже созданных

Смета формируется в разрезе каждого контракта

Контроли на соответствие сметы контракта сведениям связанного контракта в реестре контрактов:

- наличие в смете всех позиций объектов закупки из сведений о контракте
- равенство стоимости сметы контракта и цены контракта

Контракт № 57-22-Д от 25.06.2022

Реестровый номер контракта	Заказчик по государственному контракту	ИНН заказчика	Цена государственного контракта	Статус	Смета контракта
1466444832222000457	Тестовая организация 0009	4664448322	86 367 135,16 Р	Исполнение	<div>Выгрузить сведения контракта</div> <div>Уведомление о доступности формирования документов о приемке в электронной форме</div> <div>1 Создать смету контракта</div> <div>Добавить в избранное</div>
Реквизиты документа	Сумма документа	Дата направления заказчику	Дата получения заказчиком	Дата подписания заказчиком	
▼ Этап 1 с 25.06.2022 до 31.12.2022					
В рамках этапа не сформировано ни одного документа					

Контракт № 57-22-Д от 25.06.2022

Реестровый номер контракта	Заказчик по государственному контракту	ИНН заказчика	Цена государственного контракта	Статус	Смета контракта
1466444832222000457	Тестовая организация 0009	4664448322	86 367 135,16 Р	Исполнение	<div>2 Смета контракта</div> <div>Выгрузить сведения контракта</div> <div>Уведомление о доступности формирования документов о приемке в электронной форме</div> <div>Запросить выписку из ГИС «Независимый регистратор»</div> <div>3 Изменить смету контракта</div> <div>Добавить в избранное</div>
Реквизиты документа	Сумма документа	Дата направления заказчику	Дата получения заказчиком	Дата подписания заказчиком	
▼ Этап 1 с 25.06.2022 до 31.12.2022					
Документ о приемке № 002-Ф от 27.06.2022	2 088 741,60 Р	27.06.2022 23:16:33 (МСК+4)	27.06.2022 23:25:07 (МСК+4)		 
Документ о приемке № 001-Ф от 27.06.2022	3 309 065,88 Р	27.06.2022 21:11:48 (МСК+4)	27.06.2022 21:19:07 (МСК+4)	27.06.2022 21:35:56 (МСК+4)	   

ФОРМИРОВАНИЕ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Создание сметы контракта вручную

- ☐ В заголовке отображается номер версии сметы и реквизиты связанного контракта в реестре контрактов
- ☐ Поле «Наименование объекта» автоматически предзаполняется сведениями из связанного контракта в реестре контрактов и доступно для уточнения
- ☐ Заполнение позиций по смете осуществляется в блоке «Конструктивные решения и виды работ»
- ☐ Добавление позиций доступно по кнопке «Добавить». Каждую добавленную позицию можно детализировать, доступно выделение разделов
- ☐ Доступно указание позиций с типом «Работа» с текстовым объемом
- ☐ Единица измерения может выбираться из справочника ОКЕИ или из справочника общепринятых единиц измерения, согласованных Минстроем России
- ☐ Если в рамках выполнения работ было поставлено оборудование, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, то данное оборудование должно быть добавлено в смету отдельной позицией с типом «Товар» по аналогии со сведениями из связанного контракта в реестре контрактов
- ☐ Сумма НДС может быть распределена по разным ставкам НДС через контекстное меню в строке «Сумма НДС»
- ☐ В случае, если документ формируется без НДС (все объекты закупки имеют ставку НДС «Без НДС» или в окне распределения сумм по ставкам НДС вся сумма была распределена на ставку «Без НДС»), то в итоговой строке отображается текст «Без НДС»

1

Смета контракта (по контракту 57-22-Д от 25.06.2022) (версия 1, формирование сметы не завершено)

2

Информация об объекте строительства

Наименование объекта * Выполнение работ по строительству

3

Конструктивные решения и виды работ

Поиск Введите наименование конструктивного решения (вида работ), товара, работы, услуги Сбросить Найти

3

ДОБАВИТЬ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС	Стоимость	Страна происхождения	
1	Оборудование медицинское (настенная медицинская консоль)	796 Штука	10	114769	1147690 (1262459)	ГЕРМАНИЯ	⋮
2	Строительные работы				70920563.47		⋮
2.1	Устройство перекрытий	081 Квадратный метр общей площади	5600	6956	38953600		⋮
2.2	Демонтажные работы покрытий, ограждений	055 Квадратный метр	2160.5	968.38	2092184.99		⋮
2.3	Пески строительные Возвратная позиция	113 Кубический метр	1800	113.2	203760	РОССИЯ	⋮
2.4	Балки стропильные и подстропильные железобетонные	796 Штука	134	9953.83	1333813.22	РОССИЯ	⋮
2.5	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Комплекс	здание 2 этажа	1120329.98	1120329.98		⋮
2.6	Строительство корпуса	Комплекс	здание 2 этажа	27420635.28	27420635.28		⋮
Итого по смете без НДС за минусом возвратных позиций 203760 руб.					72068253.47		⋮
Сумма НДС 10%					114769		⋮
Сумма НДС 20%					14184112.69		⋮
Итого по смете с НДС					86367135.16		⋮

5

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

ЗАВЕРШИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТЫ

Возвратные позиции

- ❑ Возможность отразить в смете возвратные позиции путем активации переключателя «Возвратная позиция» при редактировании позиции сметы
- ❑ По возвратной позиции в смете выводится вспомогательный текст «Возвратная позиция», количество, цена и стоимость отображаются серым шрифтом
- ❑ Стоимость возвратной позиции не учитывается в расчетных значениях итогов по смете. При этом в итогах выводится отдельная строка «За минусом возвратных позиций» и суммой

2

Итого по смете без НДС	72068253.47
за минусом возвратных позиций 203760 руб.	
Сумма НДС 10%	114769
Сумма НДС 20%	14184112.69
Итого по смете с НДС	86367135.16

1

Конструктивное решение (вид работ)

Товар или работа *

Товар

Код товара *

08.12.11.130

ВЫБРАТЬ

Наименование *

Пески строительные

Наименование единицы измерения (ОКЕИ) *

Кубический метр [м3...]

Код единицы измерения 113

Наименование общепринятой единицы измерения

Не выбрано

Возвратная позиция

☒

Страна происхождения товара

РОССИЯ

Код страны 643

Страна регистрации производителя товара

Код страны

Количество (объем) *

1 800

Цена на единицу измерения без НДС *

113,2

Стоимость без налога - всего *

203 760,00

ФОРМИРОВАНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Личный кабинет поставщика

1

Общая информация

2

Контрагенты

3

Конструктивные решения и виды работ

4

Факт выполнения работ

5

Подписанты

Информация о контракте

Номер контракта	Дата заключения контракта	Идентификатор контракта
57-22-Д	25.06.2022	2342343521000000000457124

Общая информация о документе

1

Указать отраслевую специализацию

Наименование специализации *

Применять накопительный итог (сохранена смета контракта)

Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке

Строительство

1

Общая информация

2

Контрагенты

3

Конструктивные решения и виды работ

4

Факт выполнения работ

5

Подписанты

Настройки для формирования документа

2


☒ Производить расчет НДС в итоговых строках ⓘ

3

☐ Изменить наименования столбцов таблицы

☐ Последний документ по контракту ⓘ

☐ Блок «Настройки для формирования документа»:

- Признак производить расчет в итоговых строках (установлен по умолчанию)
- Признак «Последний документ по контракту» 

☐ Если сохранена смета, то на вкладке «Общая информация» акта **автоматически** устанавливается специализация «Строительство» и переключатель «Применяется накопительный итог (сохранена смета контракта)». Недоступно для редактирования.

ФОРМИРОВАНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Вкладка «Конструктивные решения и виды работ»

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС	Цена по контракту (контрактная цена) руб.	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период	
						Количество (объем работ)	Стоимость	Количество (объем работ)	Стоимость
1	26.60.11.121 Оборудование медицинское (настенная медицинская консоль)	796 Штука	10	114 769	1 147 690,00 (1 262 459,00)		0,00		0,00
2	Строительные работы				70 920 563,47	0	0,00	0	0,00
2.1	Демонтажные работы покрытий, ограждений	055 Квадратный метр	2160.5		2 092 184,99	0	0,00	0	0,00
Всего по акту стоимость без НДС							0,00		0,00
Сумма НДС							Без НДС		Без НДС
Всего по акту общая стоимость							0,00		0,00

- В каждом Акте отражаются все позиции по смете
- В последующих Актах объем и стоимость выполненных работ за отчетный период будет суммироваться с объемом и стоимостью с начала выполненных работ и отражаться в графе «Выполнено с начала выполнения работ»
- По необходимой позиции через пункт контекстного меню «Редактировать» заполнить блок «Выполнено за отчетный период»

3 Заполнение блока «Выполнено за отчетный период»

Выполнено за отчетный период

1 Оборудование медицинское (настенная медицинская консоль)

Количество (объем) *

1

Стоимость

114 769,00

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

Выполнено за отчетный период

1 Выполнение работ по строительству здания

Объем работы *

Строительство

Стоимость *

104 934 751,80

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

- Тип объекта закупки «Работа»:
- Объем в текстовом виде - стоимость и объем заполняется вручную;
 - Количество заполняется вручную, стоимость рассчитывается по формуле: «Количество» x «Цена за единицу по смете контракта»
- Тип объекта закупки «Товар»:
- количество заполняется вручную, стоимость рассчитывается по формуле: «Количество» x «Цена за единицу по смете контракта»

ФОРМИРОВАНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Вкладка «Конструктивные решения и виды работ»
Распределение НДС

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС	Цена по контракту (контрактная цена) руб.	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период	
						Количество (объем работ)	Стоимость	Количество (объем работ)	Стоимость
2.1	Демонтажные работы покрытий, ограждений	055 Квадратный метр	2160.5	968,38	2 092 184,99	2120.5	2 053 449,79	-40	-38 735,20
2.2	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Комплекс	здание 2 этажа	1 120 329,98	1 120 329,98	-	550 164,99		
2.3	23.61.12.122 Балки стропильные и подстропильные железобетонные	796 Штука	134	9 953,83	1 333 813,22	40	398 153,20		
2.4	08.12.11.130 Пески строительные Возвратная позиция	113 Кубический метр	1800	113,2	203 760,00	1800	203 760,00		
2.5	Устройство перекрытий	081 Квадратный метр общей площади	5600	6 956	38 953 600,00	200	1 391 200,00		
2.6	Строительство корпуса	Комплекс	здание 2 этажа	27 420 635,28	27 420 635,28	-	0,00		
Всего по акту стоимость без НДС						2 415 551,99		1 740 618,00	
за минусом возвратных позиций, руб.						0,00		0,00	
Сумма НДС (ставка 10%)						11 476,90		348 123,60	
Сумма НДС (ставка 20%)						460 156,60		2 088 741,60	
Всего по акту общая стоимость						2 887 185,49			

Распределение суммы по ставкам НДС

ДОБАВИТЬ

Ставка НДС	Сумма, руб.	Сумма НДС, руб.
20%	1 740 618,00	348 123,60
10%	0,00	0,00
Не распределено	0,00	

ОТМЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

Возможность распределения суммы НДС при наличии в Акте позиций по нескольким ставкам НДС через контекстное меню итоговой строки «Сумма НДС»

ФОРМИРОВАНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Вкладка «Конструктивные решения и виды работ»

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС	Цена по контракту (контрактная цена)	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период		
						Количество (объем работ)	Стоимость	Количество (объем работ)	Стоимость	
2.1	Демонтажные работы покрытий, ограждений	055 Квадратный метр	2160.5	968,38	2 092 184,99	2120.5	2 053 449,79	-40	-38 735,20	⋮
2.2	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Комплекс	здание 2 этажа	1 120 329,98	1 120 329,98	-	550 164,99	здание 1 этаж	-10 000,00	⋮
2.3	23.61.12.122 Балки стропильные и подстропильные железобетонные	796 Штука	134	9 953,83	1 333 813,22	40	398 153,20	40	398 153,20	⋮
2.4	08.12.11.130 Пески строительные Возвратная позиция	113 Кубический метр	1800	113,2	203 760,00	1800	203 760,00	0	0,00	⋮
2.5	Устройство перекрытий	081 Квадратный метр общей площади	5600	6 956	38 953 600,00	200	1 391 200,00	200	1 391 200,00	⋮
2.6	Строительство корпуса	Комплекс	здание 2 этажа	27 420 635,28	27 420 635,28	-	0,00		0,00	⋮
Всего по акту стоимость без НДС							2 415 551,99		1 740 618,00	⋮
за минусом возвратных позиций, руб.							0,00		0,00	
Сумма НДС (ставка 10%)							11 476,90		348 123,60	
Сумма НДС (ставка 20%)							460 156,60		2 088 741,60	
Всего по акту общая стоимость							2 887 185,49			

- При необходимости корректировки ранее заактивированных периодов доступна возможность указания отрицательных значений в блоке «Выполнено за отчетный период»
- На экранной форме вкладки «Конструктивные решения и виды работ» данные позиции будут отображаться с минусом красным цветом

- В ГИС ЕИС проводится проверка на непревышение уменьшаемого количества (объема) над ранее заактивированным количеством (объемом)
- Отрицательные значения в итогах отчетного периода возможны исключительно в акте, завершающем исполнение по контракту, в случае, если предполагается взыскание с подрядчика ранее выплаченных сумм

ФОРМИРОВАНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Вкладка «Прочие начисления»

Информация о начисленной неустойке (штрафе, пени) и уменьшении суммы оплаты

ДОБАВИТЬ

№	Требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени)	Причины начисления неустойки (штрафы, пени)	Размер неустойки (штрафа, пени), удерживаемой из оплаты по документу о приемке	
1	Требование № 12 от 25.06.2022	11-Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом	10 000,00	⋮
2	Требование № 13 от 25.06.2022	21-Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)	1 123,00	⋮
Итого, сумма неустоек (штрафов, пени)			11 123,00	

Информация об итоговой сумме документа о приемке

Всего по акту общая стоимость	2 088 741,62
Сумма удержаний	11 123,00
Всего к оплате по документам подрядчика	2 077 618,62

НАЗАД

Информация о неустойке (штрафе, пени)

Наименование требования *

Требование

Номер требования

13

Дата требования *

25.06.2022

Тип неустойки *

Штраф

Пеня

Причина начисления неустойки (штрафа, пени)

21-Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)

Размер неустойки (штрафа, пени), удерживаемой из оплаты по документу о приемке *

1 123,00

ПРОВЕРИТЬ НА НАРУШЕНИЯ


ДАЛЕЕ

ОТМЕНИТЬ

ДОБАВИТЬ

- Доступна возможность отражения информация о начисленной заказчиком поставщику неустойке (штрафе, пени), удерживаемой из оплаты по акту при наличии в связанном контракте признака «Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)»
- Добавление информации о неустойке осуществляется через кнопку «Добавить»
- В модальном окне «Информация о неустойке (штрафе, пени) обязательно указание:
 - реквизиты требования об уплате неустойки: наименование, № и дата
 - тип неустойки: штраф или пеня
 - причина начисления неустойки заполнится автоматически
 - размер неустойки
- В блоке «Информация об итоговой сумме» отображается информация о сумме всего по акту, об удерживаемой сумме неустойки (штрафа, пени) и итоговой сумме, предъявляемой подрядчиком к оплате

- ☐ Доступно только для контрактов, заключенных по результатам электронных процедур по извещениям, размещенным после 01.01.2022
- ☐ Для перехода на акт с накопительным итогом подрядчику необходимо сформировать/загрузить структурированную смету контракта в личном кабинете поставщика
- ☐ При формировании первого акта с накопительным итогом необходимо вручную внести информацию о ранее заактивированных объемах:
 - при создании первого документа с накопительным итогом проводится проверка на наличие в связанном контракте ранее подписанных актов о приемке выполненных работ (без накопительного итога) с указанной позицией
 - если такие позиции обнаружены, то при выборе в контекстном меню позиции конструктивного решения пункта «Редактировать» в модальном окне «Выполнено» нужно заполнить подраздел «С начала выполнения работ (без учета отчетного периода)»
 - в полях «Количество (объем работы)» («Объем работы» для текстового выражения) и «Стоимость» допускаются только неотрицательные значения
 - при сохранении введенных данных производится проверка на не превышение стоимости всех выполненных с начала выполнения работ (без учета отчетного периода), введенных пользователем в текущем акте, над предыдущими актами (суммарной стоимостью актов)
- ☐ Далее необходимо заполнить информацию о фактически выполненных объемах за отчетный период по активируемому текущим актом позициям

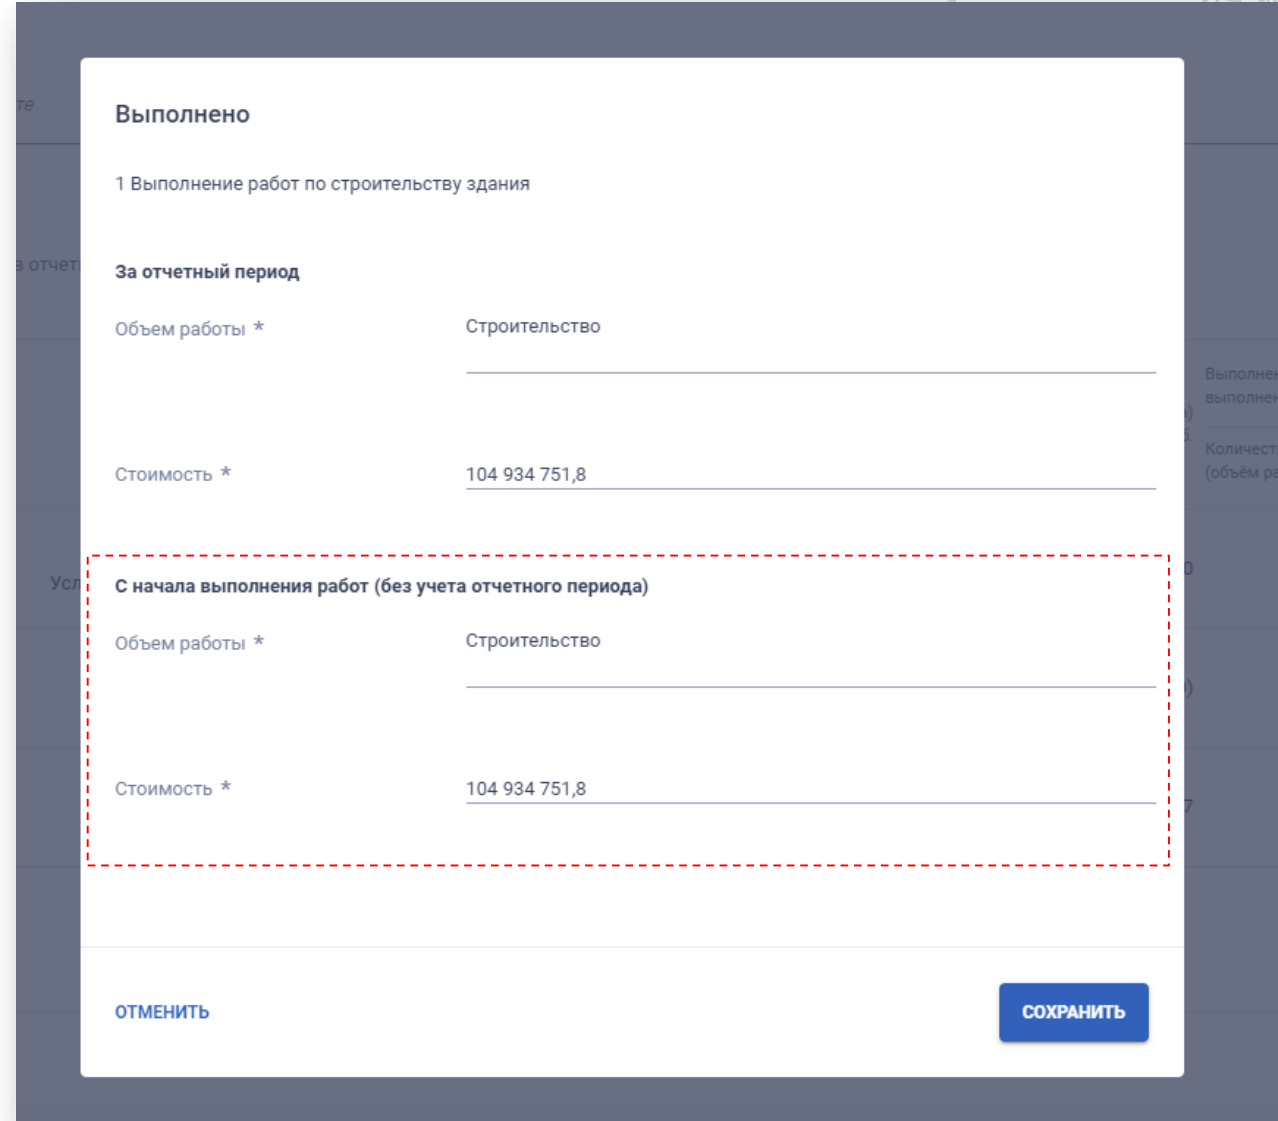

Выполнено

1 Выполнение работ по строительству здания

За отчетный период

Объем работы * Строительство

Стоимость * 104 934 751,8

С начала выполнения работ (без учета отчетного периода)

Объем работы * Строительство

Стоимость * 104 934 751,8

ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ

РАССМОТРЕНИЕ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

Личный кабинет заказчика

Реестр документов об исполнении контракта → Документ о приемке № 002-Ф от 27.06.2022

1

Общая информация (просмотр)

2

Контрагенты (просмотр)

3

Конструктивные решения и виды работ (просмотр)

4

Факт выполнения работ (просмотр)

5

Подписанты поставщика (просмотр)

6

Подписанты заказчика

Конструктивные решения и виды работ

Наименование объекта

Выполнение работ по строительству

☐ Скрывать строки с нулевым количеством (объемом) в отчетном периоде

Всего записей: 8

НазадДалее

Реестр документов об исполнении контракта → Документ о приемке № 002-Ф от 27.06.2022

1

Общая информация (просмотр)

2

Контрагенты (просмотр)

3

Конструктивные решения и виды работ (просмотр)

4

Факт выполнения работ (просмотр)

5

Подписанты поставщика (просмотр)

6

Подписанты заказчика

Информация о контракте

Идентификатор государственного контракта

2342343521000000000457124

Номер контракта

57-22-Д

Дата заключения контракта

25.06.2022

Общая информация о документе

Отраслевая специализация

Строительство (Применяется накопительный итог «сохранена смета контракта»)

Документ о приемке включает в себя счет-фактуру

Нет

Наименование документа, определенное организацией (согласованное сторонами контракта)

Документ о выполнении работ

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Саянлес"

Номер документа о приемке

002-Ф

Валюта


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Дата составления документа о приемке

- ☐ Приемка выполненных работ и поставленного оборудования осуществляется по позициям, заполненным в отчетном периоде. Доступна только полная приемка или мотивированный отказ
- ☐ Визуализация факта активирования с накопительным итогом
- ☐ Уровень детализации Акта по аналогии с ЛК поставщика
- ☐ Отображение в графах «Выполнено сначала выполнения работ» ранее заактивированных объемов нарастающим итогом
- ☐ Цветовая индикация активируемых в отчетном периоде позиций (строки подсвечены зеленой заливкой)
- ☐ Текстовая подсказка при наличии возвратных позиций
- ☐ Позиции корректировки выводятся с минусом красным цветом



Реестр документов об исполнении контракта → Документ о приемке № 002-Ф от 27.06.2022



1

Информация о начисленной неустойке (штрафе, пени) и уменьшении суммы оплаты (информация поставщика)

№	Требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени)	Причина начисления неустойки (штрафа, пени)	Размер неустойки (штрафа, пени), удерживаемой из оплаты по документу, руб.
1	Требование № 12 от 27.06.2022	11 - Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом	10000
2	Требование № 13 от 27.06.2022	21 - Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)	1123
Итого, сумма неустоек (штрафов, пени)			11123

2

Информация о начисленной неустойке (штрафе, пени) и уменьшении суммы оплаты

+ Добавить

№	Требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени)	Причина начисления неустойки (штрафа, пени)	Размер неустойки (штрафа, пени), удерживаемой из оплаты по документу, руб.
1	Штраф № 18 от 28.06.2022	11 - Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом	13700.5
Итого, сумма неустоек (штрафов, пени)			13700.5

3

Информация об итоговой сумме документа о приемке

Всего по акту общая стоимость	2088741.6
Сумма удержаний (информация подрядчика)	11123
Всего к оплате по документам подрядчика	2077618.6
Неустойки (штрафы, пени), руб.	13700.5
Итого к оплате, руб.	2063918.1

Информация о неустойках (штрафах, пени)

- ☐ На вкладке «Прочие начисления» отображается информация, введенная поставщиком. Недоступно для корректировки заказчиком
- ☐ Дополнительно доступна возможность указать информацию о начисленной неустойке (пене, штрафе) заказчиком в отдельном блоке
- ☐ При этом будет произведен пересчет в итоговой сумме к оплате

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА

СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ГИС ЕИС

Личный кабинет заказчика

Сведения об исполнении контракта:

- ☐ В печатной форме выводятся только позиции Акта, активируемые в отчетном периоде
- ☐ Отрицательные значения в полях с количеством и/или стоимостью отображаются с минусом красным цветом
- ☐ Для возвратной позиции отображается вспомогательный текст «Возвратная позиция» (красным цветом)
- ☐ Могут быть отрицательными, если сформированы на основании Акта, завершающего исполнение по контракту

Особенности формирования денежных обязательств:

- ☐ Формируется только на итоговую стоимость отчетного периода
- ☐ Формирование денежного обязательства по последнему отрицательному Акту невозможно – осуществляется возврат переплаты заказчику

Информация о количестве поставленных товаров, объеме выполненных работ, оказанных услуг

Реквизиты документа-основания	№	Наименование объекта закупки	Информация об объекте закупки по документу о приеме	Тип объекта закупки	Код позиции объекта закупки по КТРУ/ОКПД2	Количество поставленных товаров, объем выполненных работ, оказанных услуг	Стоимость исполненных обязательств без НДС	Единица измерения	Страна	
									происхождения товара	регистрации производителя товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт о приеме выполненных работ №002-Ф от 27.06.2022 (идентификатор 13825178)	1	Строительные работы		Работа	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)		1740618.00 руб. (0.00 руб. с НДС)			
	1.1	Демонтажные работы покрытий, ограждений	Демонтажные работы покрытий, ограждений	Работа	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)	-40	-38735.20 руб. При цене единицы 968.38 руб. Ставка НДС: 20%	Квадратный метр (М2)		
	1.2	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Разборка оконных блоков, кирпичных стен	Работа	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)	здание 1 этаж	-10000.00 руб. При цене единицы 1120329.98 руб. Ставка НДС: 20%	Условная единица (УСЛ ЕД) Сметная единица: Комплекс		
	1.3	Балки стропильные и подстропильные железобетонные	23.61.12.122 Балки стропильные и подстропильные железобетонные	Товар	Балки стропильные и подстропильные железобетонные (23.61.12.122)	40	398153.20 руб. При цене единицы 9953.83 руб. Ставка НДС: 20%	Штука (ШТ)	Российская Федерация (643)	
	1.4	Устройство перекрытий	Устройство перекрытий	Работа	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900)	200	1391200.00 руб. При цене единицы 6956.00 руб. Ставка НДС: 20%	Квадратный метр общей площади (М2 ОБЩ ПЛ)		



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА TELEGRAM КАНАЛ «ГИС ЕИС ЗАКУПКИ»



@gis_eiszakupki

